



Gimecol Solar

PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS

**INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO EN LOS PROYECTOS DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA LA ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO EN
BOGOTÁ (MONACHITOS, OTELO, BARBARELA Y GABRIEL FONSECA) AL 27 DE JUNIO DEL
2024.**

Remitente:

Julio Darío Fuentes Carreño
COORDINADOR DE PROYECTOS
304 259 3844
proyectos@gimecol.com

Destinatario:

Juan Camilo Gallego Vives
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
PLANEACIÓN Y OBRAS
319 568 8104
juan.gallego@gobiernobogota.gov.co

29 de junio del 2024

Bucaramanga, Santander

(

{




Gimecol Solar

PROYECTO 1 CREACIONES MONACHITOS


Planta solar de 6 módulos fotovoltaicos y 6 microinversores Enphase Energy (*uno (1) por panel solar*) interconectados a RED con una potencia de 2,52 kWp en DC

Puesta en marcha: 03 de mayo 2024

Generación de energía primer día

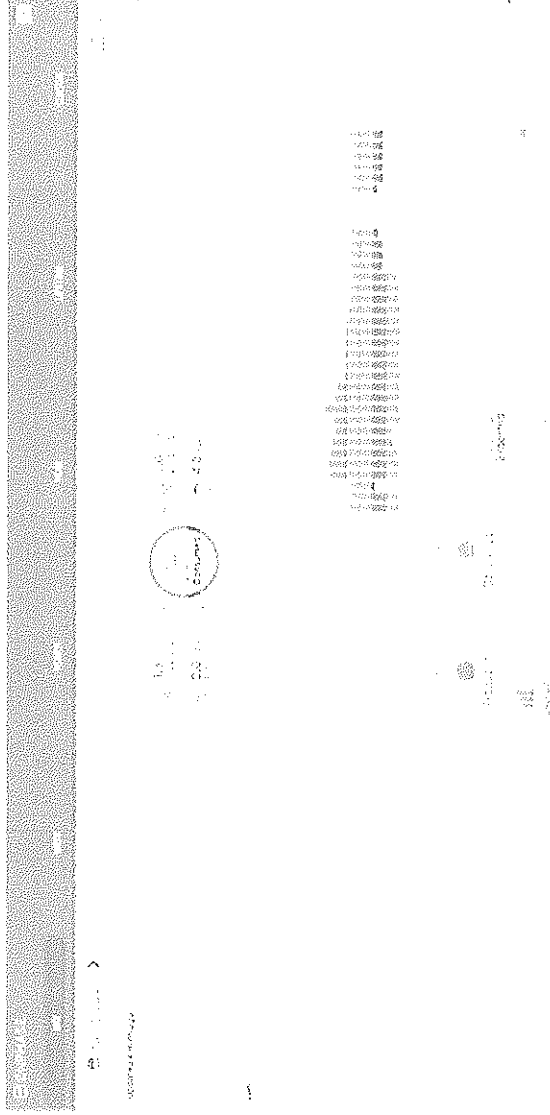

Conjunto de módulos fotovoltaicos

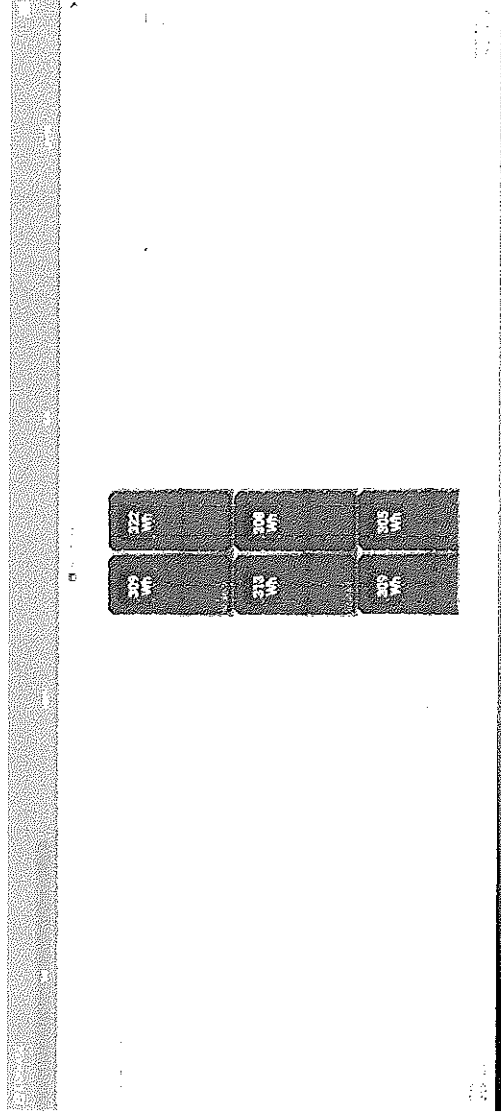

El sistema fue puesto en marcha, ni los módulos fotovoltaicos ni los microinversores presentaron inconvenientes con el encendido, y se le ha entregado el sistema de monitoreo al cliente para que pueda realizar el seguimiento de su sistema fotovoltaico

(

(



Gimecol Solar

PROYECTO 2 INVERSIONES OTELO

Planta solar de 16 módulos fotovoltaicos y 16 microinversores Enphase Energy (*uno (1) por panel solar*) interconectados a RED con una potencia de 6,72 kWp en DC

Puesta en marcha: 15 de mayo 2024

Generación de energía primer día



Enphase Energy



15 de mayo 2024



Enphase Energy



Conjunto de módulos fotovoltaicos



Enphase Energy

15 de mayo 2024

El sistema fue puesto en marcha, ni los módulos fotovoltaicos ni los microinversores presentaron inconvenientes con el encendido, y se le ha entregado el sistema de monitoreo al cliente para que pueda realizar el seguimiento de su sistema fotovoltaico

(

(




Gimecol Solar

PROYECTO 3 CALZADOS BARBARELLA

Planta solar de 32 módulos fotovoltaicos y 32 microinversores Enphase Energy (uno (1) por panel solar) interconectados a RED con una potencia de 13,4 kWp en DC

Puesta en marcha: 07 de mayo 2024

Generación de energía primer día



07 de mayo 2024

Enphase Energy



Conjunto de módulos fotovoltaicos



07 de mayo 2024



Enphase Energy

El sistema fue puesto en marcha, ni los módulos fotovoltaicos ni los microinversores presentaron inconvenientes con el encendido, y se le ha entregado el sistema de monitoreo al cliente para que pueda realizar el seguimiento de su sistema fotovoltaico



Gimecol Solar

PROYECTO 4 GABRIEL FONSECA

Planta solar de 70 módulos fotovoltaicos y 70 microinversores Enphase Energy (uno (1) por panel solar) interconectados a RED con una potencia de 29,4 kWp en DC

Puesta en marcha: 15 de junio 2024

Generación de energía primer día



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 de junio 2024



10



10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


10

10

Conjunto de módulos fotovoltaicos



10

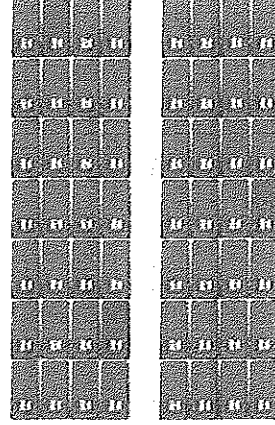

10

10

El sistema fue puesto en marcha, ni los módulos fotovoltaicos ni los microinversores presentaron inconvenientes con el encendido, y se le ha entregado el sistema de monitoreo al cliente para que pueda realizar el seguimiento de su sistema fotovoltaico


(

(




Gimecol Solar

Generación de la vida útil Monachitos

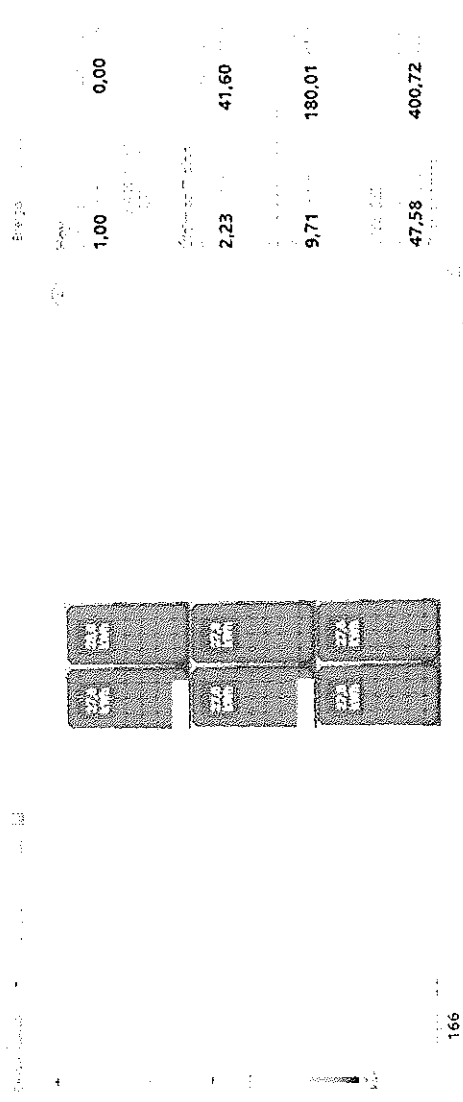


166

Generación de la vida útil Otelo

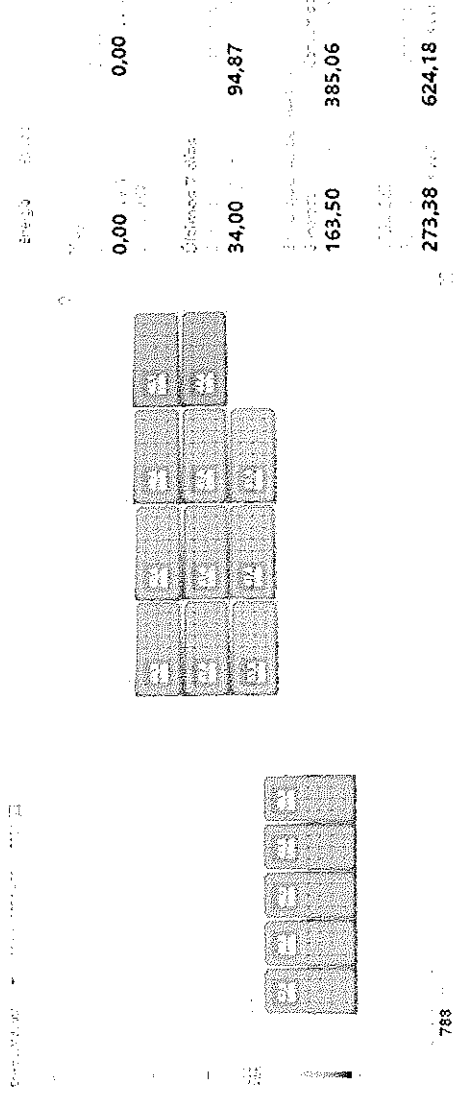

788

Generación de la vida útil Barbarella

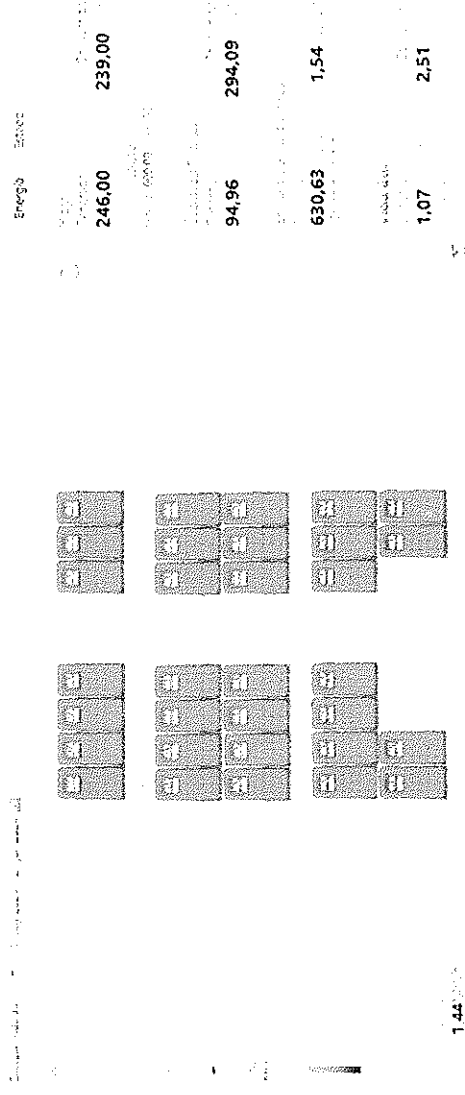

1.44



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

