



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La empresa INMEMA S.A. el día 21 de febrero de 2023 remitió a la supervisión documento por el cual solicita una prórroga de noventa (90) días al plazo de ejecución actualmente pactado hasta el 30 de marzo de 2023.

Dentro del proceso de verificación del documento se tomó la decisión de hacer una visita a planta con el fin de verificar el estado de fabricación de los elementos que hacen falta por programar, así:

1. 686 Juguetero
2. 670 Pupitre primaria mesa y silla
3. 669 Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)
4. 712 Puesto Universitario Zurdos
5. 677 Bibliobanco
6. 711 Puesto Universitario Diestro
7. 654 Cátedra mesa y silla
8. 698 Mesa para aula de informática
9. 664 Puesto administrativo en L con silla
10. 665 Puesto administrativo sencillo con silla
11. 675 Archivador horizontal 3 gavetas
12. 676 Archivador metálico
13. 680 Cartelera información institucional
14. 699 Mesa para laboratorio
15. 719 Silla mesa laboratorio


Una vez se dio el recorrido por toda la planta de producción resultado para cada uno de los ítems es el siguiente:



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

1. Para el juguetero y mesas para laboratorio serán programadas para la entrega, en virtud a que está disponible el material.

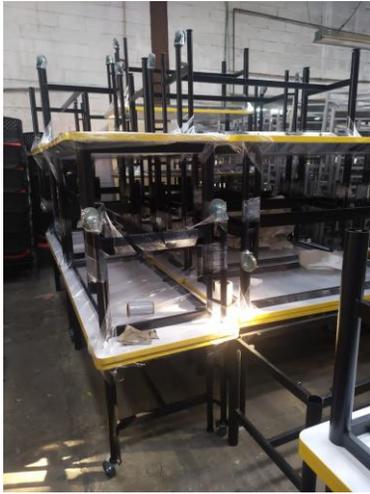

2. Pupitre primaria mesa y silla
Se evidencia que hay estructura de mesas en crudo (sin pintura), esto se da a que una vez está la madera en proceso, pasan las estructuras a pintura y posterior ensamble.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.						
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos	
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	



3. Pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)

Se evidencia que hay estructura de mesas en crudo (sin pintura), otras pintadas, estructuras de sillas sin madera del asiento y espaldar, además están las superficies de las mesas. y superficies. Con la llegada de madera de asiento y espaldar de las sillas ellos programan las ultimas actividades del proceso producto para ensamble y entrega.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	






ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

4. Puesto Universitario Zurdos y Puesto Universitario Diestro

En el recorrido de la planta se evidencia que están las partes de la estructura, la cual solo es soldada hasta la momento de programación ya que no es posible apilar en columnas altas y ocuparía mucho espacio en bodega.

Por otra parte, está listos la madera enchapada de los apoya brazos, de tal manera que una vez se tenga la madera del asiento y espalda culminan su ensamble y entrega.

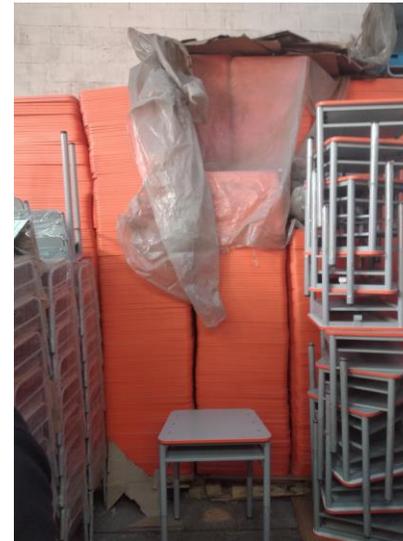



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



5. Bibliobanco

Para este elemento del contrato, se identifica que hay partes de lámina cortadas en proceso de doblado, otras en soldadura como las puertas y el zurrón, se cuenta con los entropaños ya enchapados y otros bibliobancos ya en acabado final para el proceso de entregas de los cronogramas en ejecución.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sobre este elemento si bien la estructura en acero esta todas las partes en los diferentes procesos a lo largo de la plantas y se cuentan con los entrepaños, las tapas de la parte superior de los muebles, está sujeta a la continua llegada de triplex en las próximas semanas y que permita su programación, es un elemento que usa mucho tiempo en planta para pintura y volumen.





ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	





ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



6. Cátedra mesa y silla

Dentro de recorrido de la planta se identificad que hay partes de la mesa catedra de las estructura y las cajoneras.
Por otra parte están las estructura de las sillas y acolchados, solo faltando ensamble según programación de las mimas .



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	





ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



7. Mesa para aula de informática

En el recorrido se identificó producto como:

- A. tubería ya cortada y des tijerada lista para para el proceso de soldadura,
- B. mesas ya sodadas para ser pintadas
- C. mesas listas para armado una vez llegue la superficie según la programación de entregas.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



8. Puesto administrativo en L con silla

Sobre estos ítems se dejó claro y evidenciado que dentro de la planta de inmem no se desarrolla el proceso de recepción y transformación de la madera, dicha actividad es desarrollada por un tercer.

Dentro de la planta de inmem se fabrican lacas cajoneras y luego hacen ensamble final del producto.,

En la planta del tercero se evidencia que hay material de madera ya enchapado y en proceso de fabricación de los puestos.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	





ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



9. Archivador metálico y Archivador horizontal 3 gavetas

Sobre estos elementos se halló las estructuras sin pintura en la planta de producción de inmemá, sobre la madera para el desarrollo de esto hay material en la planta del tercero, INMEMA explicó que como estrategia han pensado hacer fabricación a lo largo del mes de marzo de 2023.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



10. Cartelera información institucional

Sobre este material están las partes de acero cortadas y listas para ensamble



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



11. Silla mesa laboratorio

Están en planta la estructura disponible para pintura un aves tengan la, madera del asiento y espaldar.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



Dentro de la misma vista se identificó que hay partes de madera para elementos como los escritorios y otros productos en proceso de transformación, debido a la llegada del triplex que se ha dado y continuara así las próximas semanas.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.	
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.							
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	



Dentro de esta actividad se pudo tener la claridad que la fecha del soporte entregado por la empresa INMEMA sobre la entrega de chapilla, corresponde a la fecha en que inicia entregas de la madera a la planta del tercero donde se continúa con el proceso de transformación (corte, enchapado, y termoformado de curvas) para luego ser llevado entregado finamente en la planta de INMEMA para el ensamble final de las sillas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Planta de producción empresa INMEMA S.A.
Asunto	Visita a planta de producción del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA S.A.						
Asistentes	Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos	
Fecha de Elaboración	24.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	



Katalina Plazas Correa

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA
