



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 12
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Bogotá, D. C., 04 de mayo 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Supernumerario
Nombre y apellidos	YECID OSWALDO BELTRÁN GÓMEZ
C.C.	80.240.579
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC
Correo electrónico	yecid.beltran@forpo.gov.co
Teléfono	3112875468

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	162535-2026		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - GUTIC		
Objeto	SERVICIOS DE CANALES DEDICADOS, ACCESO A INTERNET Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN IPV6 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	CIENTO DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCT (\$112.377.495,30).		
Valor Total	CIENTO DOCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCT (\$112.377.495,30).		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31/12/2025	01/04/2026	31/12/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/04/2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARÍA CECILIA CÁRDENAS BARRIOS	67.740.591	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB	899999115

4. Información Presupuestal

VIGENCIA 2026

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9126	09/02/2026	\$ 230.000.000,00

05 MAY 2026

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 12

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
26026		31/03/2026	\$ 112.377.495,30

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

No se le solicita en el estudio previo que debe entregar un documento sobre materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 01 de abril del presente año, se acuerda con el señor Yury Latorre Capera Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el señor PSPP Yecid Oswaldo Beltrán Gómez Supervisor de la Orden de Compra, y la señora María Cecilia Cárdenas Barrios como Apoderada General de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP ETB, firmar el acta de inicio de la orden de compra No. 162535-26.
- El contratista remite el cronograma de instalación de los enlaces de conectividad, conforme a lo establecido en el plan de trabajo, para su ejecución en las diferentes sedes.

SEDE: ADMINISTRATIVA - Cra. 66a #43-18 - CANALES DE INTERNET

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicios canal PRINCIPAL y BACKUP	ETB	1/04/2026

SEDE: ADMINISTRATIVA - Cra. 66a #43-18 - CANALES DE DATOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicios canal PRINCIPAL y BACKUP	ETB	7/04/2026

SEDE: ALQUERIA - CARRERA 51 D # 46 - CANALES DE INTERNET

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicios canal PRINCIPAL y BACKUP	ETB	1/04/2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 12

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

SEDE: EL COMENDADOR - CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR - CANALES DE INTERNET

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Instalación de fibra, Empalmes y adecuaciones físicas (sin aplican) canal PRINCIPAL	ETB	07/04/2026 al 09/04/2026
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicio canal PRINCIPAL	ETB	10/04/2026
Instalación de fibra, Empalmes y adecuaciones físicas (sin aplican) canal BACKUP	ETB	13/04/2026 al 17/04/2026
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicio canal BACKUP	ETB	20/04/2026

SEDE: CAN POLICIA - CARRERA 59 # 26 - 21 CAN - CANALES DE DATOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Instalación de fibra, Empalmes y adecuaciones físicas (sin aplican)	ETB	08/04/2026 al 13/04/2026
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicios canal PRINCIPAL y BACKUP	ETB	14/04/2026

*Sujeto a aprobación de permisos por parte de la entidad.

*Se deben de tener en cuenta las paradas de reloj como lo estipula CCE.

SEDE: FUNZA - COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA - CANALES DE INTERNET

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHAS
Visita de viabilidad técnica para el trazado de ruta y levantamiento de información	ETB	06/04/2026 al 09/04/2026
Instalación de fibra, Empalmes y adecuaciones físicas (sin aplican)	ETB	13/04/2026 al 18/04/2026
Configuración de equipos, pruebas y entrega de servicios canal PRINCIPAL y BACKUP	ETB	20/04/2026

*Sujeto al tiempo entre la autorización del tercero proveedor de la infraestructura física (electrificadora, operador de red o particular propietario, entre otros) al ISP.

*Se deben de tener en cuenta las paradas de reloj como lo estipula CCE.

- Mediante correo de fecha 28 de marzo del 2026, el contratista solicita permiso para ingresar a las instalaciones de sede administrativa y sede de Venecia y envía cronograma. Se les aprueba que a partir del 01/04/2026.

Cronograma:

OC'S	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	INVESTIGACION	TENDIDO	EMPALME	CPE
OC-2292256	Venta	Internet Dedicado	ID00148534	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	OK	30/03/2026 9:00 AM	30/03/2026 9:00 AM	31/03/2026 2:00 PM
OC-2292257	Venta	Internet Dedicado	ID00148535	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	OK	30/03/2026 9:00 AM	30/03/2026 9:00 AM	31/03/2026 2:00 PM
OC-2292258	Venta	Internet Dedicado	ID00148536	CARRERA 51 D # 45 BOGOTÁ, BARRIO ALGUERÍA	BOGOTÁ, D.C.	OK	30/03/2026 9:00 AM	30/03/2026 9:00 AM	31/03/2026 2:00 PM
OC-2292259	Venta	Internet Dedicado	ID00148537	CARRERA 51 D # 46 BOGOTÁ, BARRIO ALGUERÍA	BOGOTÁ, D.C.	OK	30/03/2026 9:00 AM	30/03/2026 9:00 AM	31/03/2026 2:00 PM

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

DIEGO FELIPE URUEÑA GALINDO

INGENIERO DE PROYECTOS NIVEL I

DIRECCION PROYECTOS E IMPLEMENTACION

VICEPRESIDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DIGITALES

N/A

305 921 5542

) etb



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- Mediante correo de fecha 06 de abril del 2026, el contratista solicita permiso para ingresar a las instalaciones de la sede del Centro Edificio el Comendador, y sede Policía CAN. Es de anotar que para la sede con Policía se debe realizar coordinaciones mediante caso sigma para su autorización.

OC'S	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	INVESTIGACION	TENDIDO	EMPALME	CPE
OC-2292262	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Internet Dedicado	ID00148540	Sucursal BOGOTÁ, D.C. SEDE CENTRO CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	BOGOTÁ, D.C.	07/04/2026 9:00 AM	06/04/2026 7:00 AM	09/04/2026 9:00 AM	10/04/2026 7:00 AM
OC-2292263	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Internet Dedicado	ID00148541	Sucursal BOGOTÁ, D.C. SEDE CENTRO CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	BOGOTÁ, D.C.	09/04/2026 9:00 AM	09/04/2026 7:00 AM	10/04/2026 9:00 AM	10/04/2026 7:00 AM
OC-2292264	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148542	Cra. 66a #43-18	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	N/A	N/A	N/A	07/04/2026 9:00 AM
OC-2292265	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148543	Cra. 66a #43-18	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	N/A	N/A	N/A	07/04/2026 11:00 AM
OC-2292267	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Conectividad Avanzada IP	CAV3000148532	SEDE POLICIA CAN	SEDE POLICIA, CARRERA 59 # 26 - 21 CAN	BOGOTÁ, D.C.	06/04/2026 9:00 AM	10/04/2026 7:00 AM	12/04/2026 7:00 AM	14/04/2026 9:00 AM

- Mediante correo electrónico de fecha 07 de abril del 2026 el contratista envía cronograma y solicita permiso para el ingreso a la sede de Funza.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESOS FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE FUNZA [Resumir](#)

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruñagalindo@colvatel.com.co> [Responder](#) [Responder a todas](#) [Reenviar](#) [Mar 07/04/2026 14:06](#)

Para: Yecid Oswaldo Beltran Gomez; Yury Latorre Capera
 CC: Jaime Junior Paipa Camargo; Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angelm@colvatel.com.co>; [y 3 más](#)

FUNZA 1.zip
4 MB

Buenas tardes
 Cordial saludo

El presente tiene por objeto solicitar de su amable colaboración con la gestión del trámite de permisos de ingreso, con la finalidad de ejecutar las actividades programadas en las sedes, fechas y horarios relacionados a continuación:

OC'S	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	PRODUCTO	ID SERVICIO	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	INVESTIGACION
OC-2292260	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Venta	Internet Dedicado	ID00148538	Sucursal BOGOTÁ, D.C. COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	BOGOTÁ, D.C.	07/04/2026 9:00 AM

Es importante garantizar las condiciones físicas y eléctricas en la sede. Además, deben tramitarse los permisos correspondientes con las administraciones de edificios, centros comerciales, parques industriales, predios vecinos o terceros, terrazas y/o techos de las edificaciones, para que el personal designado por ETB pueda llevar a cabo los trabajos requeridos en las instalaciones.

- Mediante correo electrónico de fecha 13 de abril del 2026, el contratista informa que después de la visita de fiabilidad realizada el día 9 de abril al complejo industrial de Funza, en la cual se determina la aplicación de parada de reloj, por acuerdo a las condiciones transversales – ítem 4 “permisos con la electrificadora”.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 12
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

Diego Felipe Uruña Galindo <diego.uruenag@colvotel.com.co>
 Para: Jefatura TELEM: wilmtorv@etb.com.co; conectividad.cce@etb.com.co
 CC: Yecid Oswaldo Beltran Gomez
 Lun 13/04/2026 12:00

Reenvió este mensaje el Lun 20/04/2026 10:11.

Buenos días

Cordial saludo

Se informa que se realizó visita de factibilidad el 9 de abril de 2026, en la cual se determinó la aplicación de parada de reloj por acuerdo a las condiciones transversales – ítem 4 (permisos con la electrificadora). Lo anterior, conforme a lo establecido:

"El tiempo entre la autorización del tercero proveedor de la infraestructura física (electrificadora, operador de red o particular propietario, entre otros) al ISP y lo puesto en funcionamiento del servicio; esto de acuerdo con las Resoluciones CRC 3101 de 2011, CREG 067 de 2013 y CREG 140 de 2014, y aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan."

En este sentido, se tiene un tiempo estimado de gestión entre 30 y 45 días, sujeto a la respuesta del tercero. Posterior a la aprobación, se estará compartiendo el cronograma de instalación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,
DIEGO FELIPE URUÑA GALINDO
 INGENIERO DE PROYECTOS NIVEL I
 DIRECCIÓN PROYECTOS E IMPLEMENTACIÓN
 VICEPRESIDENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
 DIGITALES
 N/A 305 921 3342

- Mediante correo electrónico de fecha 16 de abril del 2026, el contratista entrega el direccionamiento de las IPs y topología de la sede administrativa y la sede de Venecia.

ETB \ ENTREGA FORMAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE ADMINISTRATIVA // SEDE VENEZIA [Resumir](#)

Reenvió este mensaje el Lun 20/04/2026 9:41.

3 archivos adjuntos (431 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policia Descargar todo

VICEPRESIDENCIA EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS

Respetado Sr.(a) FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa. Para ETB es muy importante continuar brindando soluciones tecnológicas de última generación que faciliten y optimicen sus comunicaciones. Ofrecer un servicio de alta calidad y garantizar su satisfacción es nuestro principal objetivo.

Nos permitimos informar que su requerimiento ha sido cumplido satisfactoriamente. A continuación, se relacionan las características del servicio entregado:

OC'S	TRÁMITE	PRODUCTO	ID SERVICIO	BW	SUCURSAI	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	FECHA DE INICIO DE FACTURACION
OC-2292259	Venta	Internet Dedicado	ID00148537	100 Mbps	Sucursal BOGOTÁ, D.C. CARRERA 51 D # 46 BOGOTÁ, BARRIO ALQUERÍA	CARRERA 51 D # 46 BOGOTÁ, BARRIO ALQUERÍA	BOGOTÁ, D.C.	01-abr-2026
OC-2292258	Venta	Internet Dedicado	ID00148536	100 Mbps	Sucursal BOGOTÁ, D.C. CARRERA 51 D # 46 BOGOTÁ, BARRIO ALQUERÍA	CARRERA 51 D # 46 BOGOTÁ, BARRIO ALQUERÍA	BOGOTÁ, D.C.	01-abr-2026
OC-2292257	Venta	Internet Dedicado	ID00148535	500 Mbps	Cra. 66a #43-18	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	01-abr-2026
OC-2292256	Venta	Internet Dedicado	ID00148534	500 Mbps	Cra. 66a #43-18	Cra. 66a #43-18	BOGOTÁ, D.C.	01-abr-2026

- Mediante correo electrónico de fecha 20 de abril del 2026, el contratista entrega el direccionamiento de las IPs y topología de la sede del centro edificio El Comendador.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 12
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

Diego Felipe Urueña Galindo Responder Responder a todos Reenviar
 Para: Yury Latorre Capera; Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
 CC: WILMER YESSIT TORRES VEGA <wiltorv@etb.com.co>; Sergio Enrique Rodríguez Bonilla <sergio.rodriguez@colvatel.com.co>; y 2 más Lun 20/04/2026 17:34

PRUEBA_CONECTIVIDAD_ID0... 2 KB PRUEBA_CONECTIVIDAD_ID0... 2 KB

4 archivos adjuntos (94 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo



ACTA DE ENTREGA DE SERVICIOS

Repetido 3 (9) FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa. Para ETB es muy importante continuar ofreciendo soluciones tecnológicas de última generación que facilitan y optimizan sus comunicaciones. Crear un servicio de alta calidad y garantizar su satisfacción es nuestro principal objetivo.

Nos permitimos informar que su requerimiento ha sido cumplido satisfactoriamente. A continuación, se relacionan las características del servicio entregado:

DC'S	TRÁMITE	PRODUCTO	ID SERVICIO	RW	SUCURSAL	DIRECCION INSTALACION	CIBDAD	FECHA DE PRICIO DE FACTURACION
CC-2292263	Venta	Internet Dedicado	ID00148541 PVAL	6 Mbps	Sucursal BOGOTÁ, D.C. SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	BOGOTÁ, D.C.	20-abr-2026
CC-2292262	Venta	Internet Dedicado	ID00148540 BACRUP	6 Mbps	Sucursal BOGOTÁ, D.C. SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	SEDE CENTRO, CARRERA 10 # 12 EDIFICIO EL COMENDADOR	BOGOTÁ, D.C.	10-abr-2026

- Mediante correo electrónico de fecha 21 de abril del 2026, el contratista envía cronograma de instalación del canal de internet a la sede de Funza, el cual se encontraba en "Parada de Reloj" teniendo en cuenta que se debió solicitar unos permisos a la electrificadora.

ETB \ TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESOS FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE FUNZA Resumir

Para: Yury Latorre Capera; Yecid Oswaldo Beltrán Gómez; María Isabel Pedraza Calderón Mar 21/04/2026 14:32
 CC: Jaime Junior Paipa Camargo; Leonardo Ángel Montenegro <leonardo.angelm@colvatel.com.co>; y 3 más

LIBERTY NETWORK.zip 5 MB INST_BOG UPINET.zip 3 MB Parafiscales Mar-Abril INST_B... 5 MB

3 archivos adjuntos (12 MB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

Buenas tardes

Cordial saludo

El presente tiene por objeto solicitar de su amable colaboración con la gestión del trámite de permisos de ingreso, con la finalidad de ejecutar las actividades programadas en las sedes, fechas y horarios relacionados a continuación:

DC'S	TIPO OPERACION	PRODUCTO	ID SERVICIO	DIRECCION INSTALACION	CIUDAD	PROVEEDOR UM	INVESTIGACION	TENDIDO	EMPALMAE	INSTALACION EQUIPOS UM
CC-2292261	Venta	Internet Dedicado	ID00148539	COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	BOGOTÁ, D.C.	LIBERTY NETWORKS	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
CC-2292260	Venta	Internet Dedicado	ID00148538	COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, FUNZA, BODEGAS 13C, 14C y 15C	BOGOTÁ, D.C.	UPINET	OK	COMPLETA 8:00 AM - 10:00 AM	COMPLETA 8:00 AM - 10:00 AM	COMPLETA 8:00 AM - 10:00 AM

Es importante garantizar las condiciones físicas y eléctricas en la sede. Además, deben tramitarse los permisos correspondientes con las administraciones de edificios, centros comerciales, parques industriales, predios vecinos o terceros, terrazas y/o techos de las edificaciones, para que el personal designado por ETB pueda llevar a cabo los trabajos requeridos en las instalaciones.

Adicionalmente, solicito compartir la información de la persona que realizará el respectivo acompañamiento y confirmar las actividades, en caso de no contar con confirmación se procederá a realizar la cancelación del cronograma y se enviará nueva fecha de acuerdo con capacidad operativa.


Se anexa listado de personal y se adjunta parafiscales

- El contratista atiende la reunión virtual solicitada por la supervisión, el día 24 de abril del 2026, a la cual asiste el ing Diego Felipe Urueña Galindo, la señora Diana Marcela Díaz Sabogal, ing Sergio Enrique Rodríguez Bonilla, el señor Leonardo Ángel Montenegro por parte de la Empresa de Telecomunicaciones ETB, y por parte del Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones asistieron el Señor Capitán Gober Wilson Rivera Monroy, ing Yury Latorre Capera y el ing Yecid O. Beltrán Gómez.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 12
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

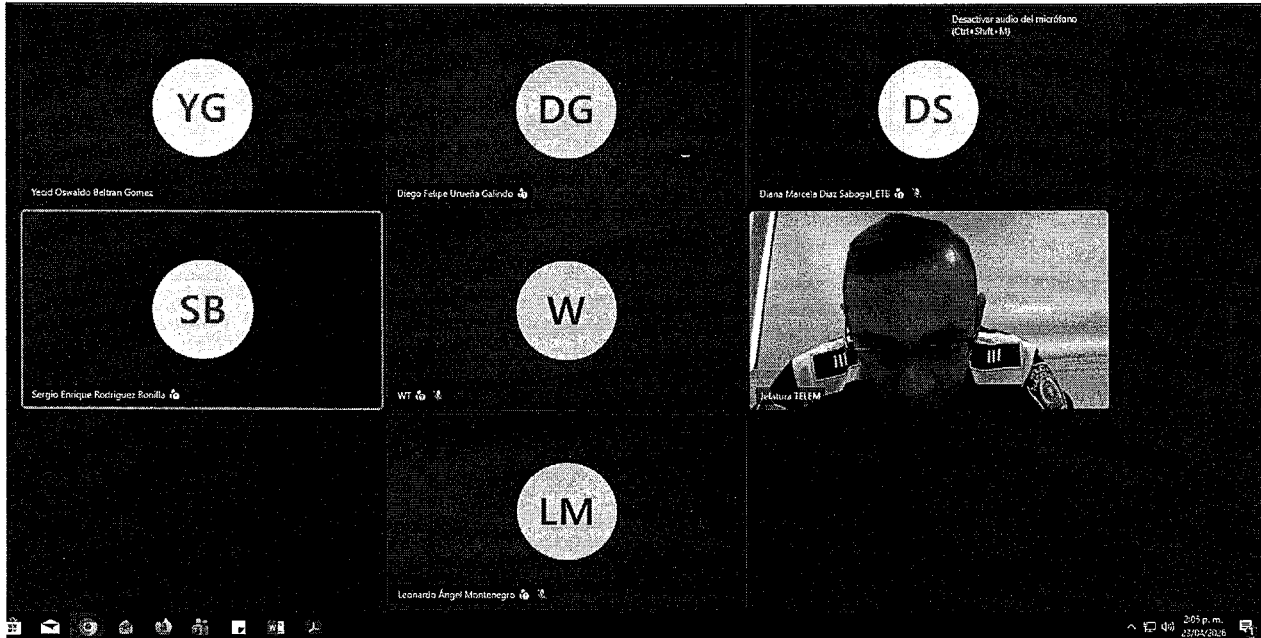

En la reunión se trató los siguientes temas:

Conexión y configuración del canal de internet en el complejo de Funza, el cual se realizará el día 24 de abril a partir de las 10 am.

Pendiente la entrega de la herramienta de monitoreo; lo cual incluye capacitación y entrega de credenciales.

Pendiente reunión con un ejecutivo de experiencia al cliente para la verificación de la facturación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 de abril del presente año, se acuerda con el señor Yury Latorre Capera Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el señor PSPP Yecid Oswaldo Beltrán Gómez Supervisor de la Orden de Compra, y la señora María Cecilia Cárdenas Barrios como Apoderada General de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP ETB, firmar el acta de inicio de la orden de compra No. 162535-26.
- Teniendo en cuenta la firma del acta de inicio se aprueba el cronograma de instalación de los enlaces de conectividad.
- Mediante correo electrónico de fecha 06/04/2026 se autoriza el ingreso al edificio el comendador, y se informa al contratista que el funcionario por parte de FORPO que va hacer el acompañamiento es el señor Yecid O. Beltrán integrante grupo GUTIC. Y se le informa al contratista que el ingreso a Policía CAN, está pendiente por autorización.
- En atención al correo del 06 de abril del 2026, donde el contratista solicita permiso para ingresar a las instalaciones de la sede Policía Nacional CAN, se les informa que se solicitó los permisos mediante caso SIGMA, y se está a la espera de la autorización.



- Mediante correo electrónico de fecha 08/04/2026, se le informa al contratista la autorización para el ingreso a la sede de Funza y se le solicita información del vehículo para el ingreso, y realiza el acompañamiento por parte de FORPO el señor Técnico Kevin Cabezas.
- Mediante correo electrónico de fecha 22 de abril del 2026, la supervisión convoca a una reunión virtual para el día 23 de abril del presente año a las 02:00 p.m., con el fin de verificar el estado de avance de la instalación de los canales de internet, especialmente la conexión de la sede de Funza, y demás actividades.

Convocatoria a reunión - Orden de Compra No. 162535-26 [Resumir]

Yecid Oswaldo Beltrán Gómez
 Para: jose.aldanab@etl.com.co; Diego Felipe Urueta Galindo <diego.urueta@etl.com.co>; CONECTIVIDAD CCE <conectividad.cce@etl.com.co>
 CC: Yury Latorre Capera: GOBER WILSON RIVERA MONROY <gober.rivera1095@correo.policia.gov.co>

Jun 25/04/2026 9:28

Cordial saludo,


En el marco de la Orden de Compra No. 162535-26, cuyo objeto es el "Servicio de canales dedicados, acceso a internet y renovación de suscripción IPv6 para el Fondo Rotatorio de la Policía", me permito convocarlos a una reunión virtual el día de hoy, 23 de abril del presente año, a las 02:00 p.m.

El propósito de la reunión es verificar el estado de avance de la instalación, así como revisar las actividades pendientes para el cumplimiento del objeto contractual.

Reunión de Microsoft Teams
 Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/270103836089593?p=5QPMV8aC06rOGFlp40>
 Id. de reunión: 270 103 836 089 593
 Código de acceso: 3W623JUL

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su confirmación.

Atentamente,

 **Yecid Oswaldo Beltrán Gómez**
 Ingeniero de Sistemas
 Integrante Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Yecid.Beltran@forpo.gov.co
 Teléfono: 3009126596 Ext. 104
 Carrera 66# # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

- Mediante correo electrónico de fecha 21 de abril del 2026, la supervisión aprueba el cronograma de instalación del canal de internet a la sede de Funza, el cual se encontraba en "Parada de Reloj" teniendo en cuenta que se debió solicitar unos permisos a la electrificadora.

5.3. Actividades por realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica, ya que el contrato corresponde a un servicio de internet y no contempla actividades de mantenimiento preventivo o correctivo.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica, ya que el contrato fue suscrito mediante acuerdo marco, por lo cual las condiciones y precios ya se encuentran previamente definidos.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 9 de 12

Código: CO-FR-0001



Vigente a partir del 12/09/24



Versión: 1

Nota: El contratista viene desarrollando y cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 162535-2026.

Código de Servicio	Producto	Cantidad	Cumple	No Cumple
S1-N-CT-1-23	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-15	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-2-14	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-CT-1-4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	X	
S1-N-SC-7-5	Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6_Lacnic - Todas las Zonas - NA - NA - NA - NA - Prefijos - /48 - Anual - CANTIDAD: 1	1	X	

5.5 Registro Fotográfico

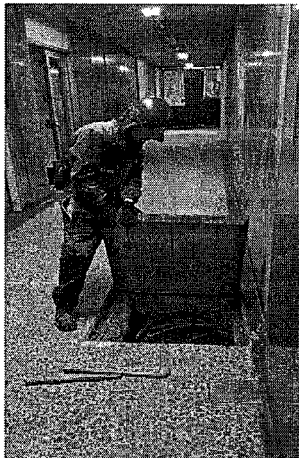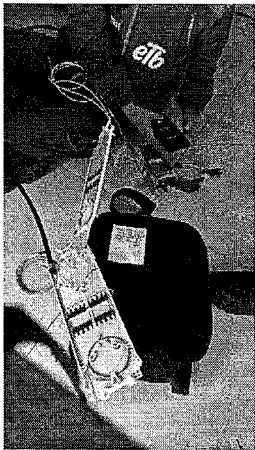

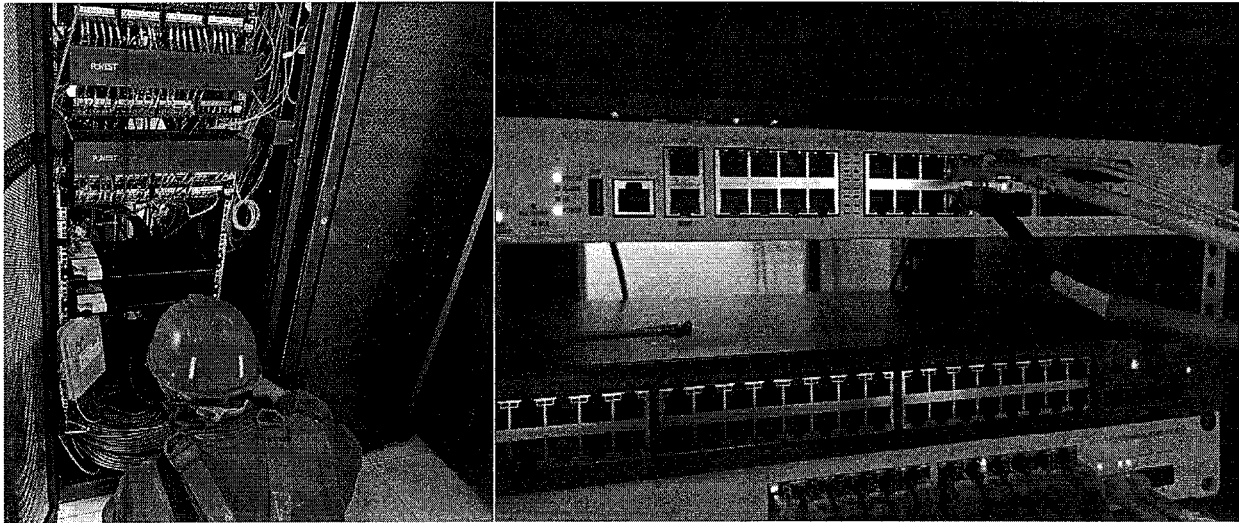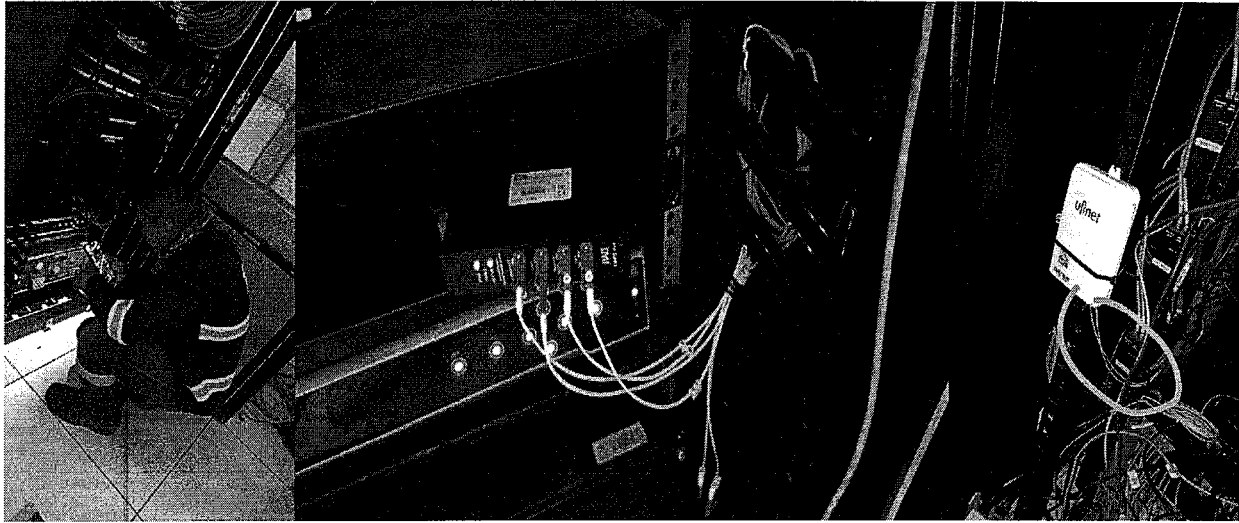

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 12
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

-----	-----	-----	-----	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00 %
SALDO			\$ 112.377.495,30	\$ 0,00	0,00 %

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	11,11%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	0,0%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		9502888869

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Adición	---	---	---	---	N/A
Prórroga	---	---	---	---	N/A
Modificación	---	---	---	---	N/A
Suspensión	---	---	---	---	N/A
Reinicio	---	---	---	---	N/A
Aclaratoria	---	---	---	---	N/A
Otros	---	---	---	---	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
LIBERTY SEGUROS S.A.	2083022	25/03/2026	\$ 16.856.625,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 11.237.750,00	24/03/2026	30/06/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	5	\$ 5.618.875,00	24/03/2026	31/12/2029

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 12 de 12
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12 Observaciones del Supervisor

El contratista comienza a ejecutar sus obligaciones contractuales conforme a lo establecido en la Orden de Compra No. 162535-2026.

PSPP YECID OSWALDO-BELTRÁN GÓMEZ
Funcionario Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones

03 MAY 2026
